積 算 工 程 表

工事件名　庄川橋りょうペイント塗替他工事(2026)
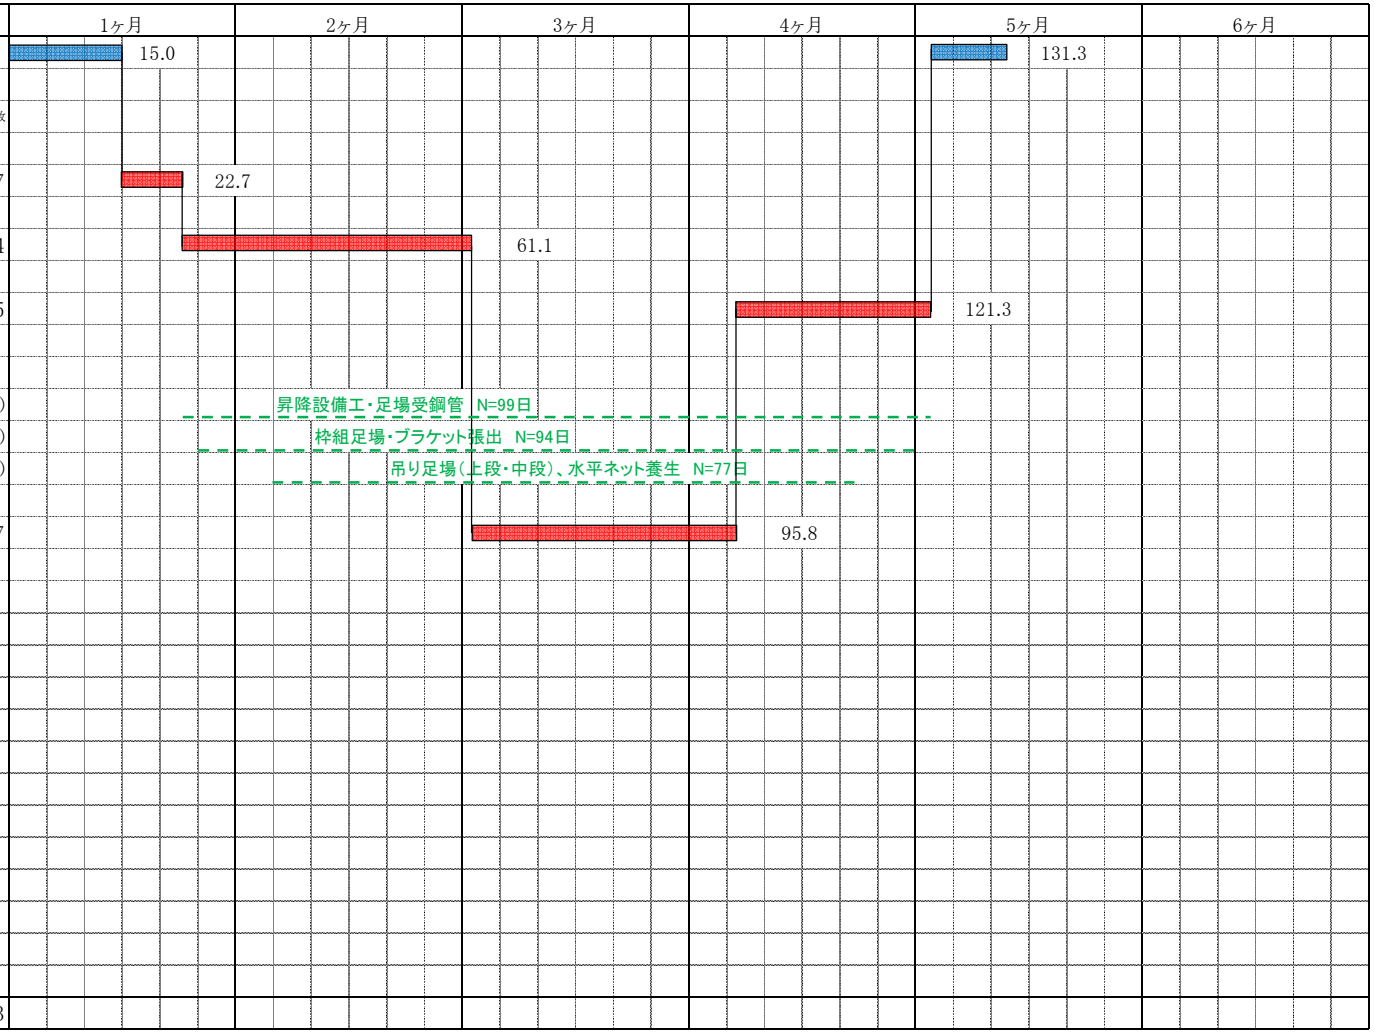
前提	内訳	日数		
準備・片付け		15.0＋10.0		
		施工日数		供用日数
ヤード整備工		5.9		7.7
仮設足場設置工		29.5		38.4
仮設足場撤去工		19.6		25.5
	(設置・撤去日数　内訳)			
	昇降設備工・足場受鋼管	(3.9)		(5.1)
	枠組足場・ﾌﾞﾗｹｯﾄ張出	(13.1)		(17)
	吊り足場・水平ﾈｯﾄ養生	(32.1)		(41.7)
橋りょう塗装工		26.7		34.7
				131.3
